

 EUROHINCA Europea de Hincas Teledrigradas, S.A.U.	PROCÉDURE DE MONTAGE DU RESERVOIR D'EAU Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0024	 acciona EUROHINCA Agua Europa de Hincas Teledrigradas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-CN-PR-0024		

ACCIONA AGUA DOCUMENT FOURNISSEUR/ENTREPRENEUR CODE DE STATUT DE RÉVISION :	
L'autorisation de procéder ne constitue pas une acceptation ou une approbation des calculs de détails de conception, des analyses, des méthodes d'essai ou des matériaux développés ou sélectionnés par le fournisseur/entrepreneur, et ne dispense pas le fournisseur/entrepreneur du plein respect de ses obligations contractuelles.	
INGÉNIEUR RESPONSABLE :	DATE:
DISCIPLINE:	RDA :
Numéro de commande/contrat :	
N° DE DOCUMENT D'ACCIONA :	N° DE SOUMISSION :
N° DE DOCUMENT DE PROJET :	N° DE SOUMISSION :

PROCÉDURE DE MONTAGE DU RESERVOIR D'EAU

01	16/04/2025	APPROUVÉ POUR LA CONSTRUCTION	M.ZAIM	H. TRIGAL	M.YAHYAOU
00	15/04/2025	APPROUVÉ POUR LA CONSTRUCTION	M.ZAIM	H. TRIGAL	M.YAHYAOU
TOUR	DATE	DESCRIPTION	PRÉPARÉ	RÉVISÉ	APPROUVÉ

Date: 16/04/2025

Rév. 01

ACCIONA WATER CASABLANCA PROJECT
Casablanca-Settat RO Plant Project

Approved Civil Department

Date: 12.9.25

Signature:

Page 0 de 22



Índice:

1. Indicaciones antes del montaje

- 1.1. Su seguridad es lo primero.
- 1.2. Conservación del material.
- 1.3. Garantía y gestión de reclamaciones.
- 1.4. Preparación del terreno.
- 1.5. Par de apriete de tornillos y nomenclatura de las chapas.
- 1.6. Normas de uso y mantenimiento.

2. Depósitos sin funda

- 2.1. Cimentación.
- 2.2. Detalle de la tubería de vaciado.
- 2.3. Montaje de las chapas y posición de los tornillos.
- 2.4. Posición de la masilla.

1. Indicaciones antes del montaje

Agradecemos la confianza depositada en Gandaria Servicios Ganaderos por la compra del depósito de agua que acaba de adquirir.

Tiene en sus manos un manual de montaje y uso que pretende ser un guía o ayuda y que está abierto a las aportaciones que pueda hacer un montador experimentado respecto a la forma de realizar el montaje, siempre respetando las indicaciones de espesores y posición de las piezas.

Mientras el producto que usted ha adquirido tenga vida útil, por favor no pierda este manual, puede necesitarlo en un futuro. Si necesitada una copia del mismo póngase en contacto con nosotros.

1.1. Su seguridad es los primero.

A lo largo del presente manual, usted va a poder ver diferentes croquis y aclaraciones de cómo montar su depósito, preste especial atención a las indicaciones de advertencia y utilice todos los recursos preventivos de que disponga: calzado de seguridad, casco, etc.

Tenga claro que el presente manual no asume responsabilidad alguna con respecto a la correcta construcción e inspección, montaje o uso de su depósito, de conformidad con la legislación aplicable, todo lo cual es la única responsabilidad del comprador y de aquéllos que efectúen el trabajo de montaje.

Seguridad en el Área del Trabajo

- 1.1.1 Bajo ninguna circunstancia se debe permitir que personas que **no** estén involucradas en el montaje estén en el área de trabajo.
- 1.1.2 Sea ordenado y trabaje en condiciones de limpieza. Todas las piezas de las que se compone su depósito se encuentran debidamente identificadas. El abandono de piezas y la excesiva dispersión de las mismas, puede ser causa de accidentes como golpes o caídas.

1.1.3 Muchas piezas que incluye su proyecto disponen de ángulos cortantes, por favor **haga obligatorio a todo su equipo de montaje la utilización de guantes mientras duren las tareas de montaje.**

1.1.4 Haga partícipe de este manual a todo su equipo de trabajo, para que conozcan bien cada uno de los componentes con los que tendrán que trabajar.

1.2 Conservación del material.

A pesar de que estas piezas disponen de tratamientos químicos de resistencia a los fenómenos meteorológicos como nieblas, lluvias o nieve debe prestar especial atención a:

1.2.1 Para las operaciones de descarga disponga de operarios cualificados en la conducción de carretillas elevadoras y tenga en cuenta el lugar donde deposita los materiales.

1.2.2 Sea ordenado en la descarga de materiales para poder controlarlos a la hora de iniciar el montaje.

1.2.3 El almacenaje de todos los materiales galvanizados o prelacados debe de ser **un lugar ventilado, aislado del suelo y cubierto**. La infiltración de agua en el interior como consecuencia de lluvia o humedad puede provocar la formación de moho blanco, que produciría un efecto antiestético.

1.3 Garantía y gestión de reclamaciones.

Las piezas que componen su depósito de agua, han sido verificadas y contadas cuidadosamente antes de su exposición. No obstante, aconsejamos durante la recepción del material, que se comprueben cuidadosamente las cantidades y dimensiones de las destinadas partes, con ayuda de los listados de piezas que se incluyen en este manual. No se aceptarán reclamaciones de material transcurridos más de 15 días de la recepción del material.

1.3.1 Fabricación y materiales:

Gandaria garantiza los productos que fabrica libres de defectos en materiales y mano de obra bajo condiciones normales de uso y servicio durante un período de **dos años** a partir de la fecha de entrega al cliente.

Obligación de Gandaria y Derecho Exclusivo del Cliente al Resarcimiento:

La única obligación de Gandaria y el derecho exclusivo del Cliente al resarcimiento bajo los términos de la presente garantía son los siguientes:

Si dentro del período de **dos años** desde la entrega del producto al cliente, éste **se deteriora debido a defectos del material o mano de obra**, Gandaria proveerá a su criterio la reparación de las piezas defectuosas o su reemplazo por otras piezas nuevas.

1.3.2 Condiciones, Limitaciones y Exclusiones:

La presente garantía no se extiende a cualquier producto fabricado o vendido por Gandaria, ni a su comerciabilidad ni a su adaptabilidad para un propósito determinado.

Bajo los términos de la presente garantía, Gandaria no será responsable por daños personales o por daños materiales. La presente garantía no cubre defectos o daños causados por mal uso, mantenimiento inadecuado o instalación incorrecta del producto de Gandaria o de cualquier equipo vinculado a nuestros productos. La modificación en obra de este producto sin el permiso expreso por escrito por parte de Gandaria constituye un mal uso del producto. **Gandaria no tendrá responsabilidad alguna bajo los términos de la presente garantía hasta que se haya efectuado el pago total del producto en cuestión por parte del cliente.**

Esta es la única garantía ofrecida por Gandaria. Nadie está autorizado a ofrecer otras garantías en nombre de Gandaria.

1.3.3 Gestión de Reclamaciones:

Gandaria dispone de un sistema de trabajo basado en la Norma UNE-ISO 9001 – 2008. Sistemas de Gestión de Calidad. En este sentido se establecen en base al Procedimiento de Gestión de Reclamaciones por parte del cliente las siguientes condiciones:

- La reclamación deberá de indicar los siguientes datos obligatoriamente:
 - Referencia del Pedido de Cliente.
 - Identificación de la persona que reclama.
 - Descripción de la reclamación.
 - Descripción de la pieza/s afectada/s.
- Junto con la reclamación, el cliente deberá aportar evidencias objetivas de lo reclamado: fotografías, escaneado de documentos...

Gandaria se compromete a dar respuesta a la reclamación del cliente siempre que esta entré en tiempo y forma.

Para cualquier duda, nuestro departamento técnico queda a su disposición para aclararlas, no dude en consultarlo.

Tel. +34 924 750 008

Fax. +34 924 751 845

e-mail gandaria@gandariaspain.com

1.4 Preparación del terreno.

Seleccione cuidadosamente el terreno, asegurándose en todo momento que posee una capacidad resistente suficiente. El cálculo de la cimentación necesaria para el depósito será por cuenta del cliente así como estudio geotécnico necesario para dicho cálculo de la cimentación.

Se requiere una buena nivelación del mismo, de forma que la presión que ejerce

el agua sobre las paredes del depósito sea uniforme.

1.5 Par de apriete de tornillos y nomenclatura de las chapas

Par de apriete de tornillos.

M8 calidad 8.8 25Nm

M10 calidad 8.8 49Nm


Nota: Este par de apriete es válido solo para tornillos montados sin arandelas de goma o neopreno

Nomenclatura de las chapas:

Aquellos depósitos compuestos por chapas de distinto tipo o espesor, éstas irán identificadas por una pegatina que indicará el tipo de chapa, su espesor y la cantidad, según la siguiente nomenclatura:

Ejemplo:

Chapa de depósito de 1,2mm de espesor.

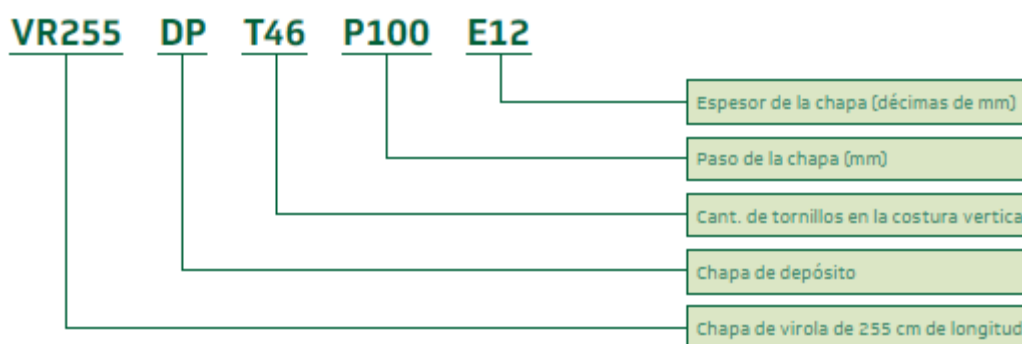

1.6 Normas de uso

El depósito de agua que Ud. Ha adquirido ha sido diseñado y fabricado para el **almacenaje de agua exclusivamente**, por lo que un uso distinto podría dañarlo seriamente y quedaría fuera de toda actuación en garantía por parte de Gandaria.

Si el agua con el que Ud. Llenará el depósito se prevé que por su composición pueda ser agresiva al galvanizado de las chapas se recomienda su protección mediante el pintado de su superficie interior, mediante en base al cloro-caucho o similar. En este proceso se aconseja seguir las indicaciones del fabricante de la pintura.

Así mismo se aconseja un mantenimiento mínimo, consistente en su vaciado periódico para su limpieza. En el caso de utilizar algún producto se aconseja consulte a su proveedor que sea adecuado y no dañe por tanto el galvanizado.



Atención: Inspeccionar periódicamente cada 3 meses el interior y exterior del depósito, cualquier síntoma de corrosión en la superficie del depósito puede originar la rotura del mismo.

2. Depósitos sin funda

2.1. Cimentación


Se hará un anillo zuncho circular de hormigón armado, indicaciones de los planos. El zuncho ha de estar nivelado para que la virola este horizontal.

No se ha de echar el hormigón hasta que la primera virola está montada y atada a los estribos de la cimentación.

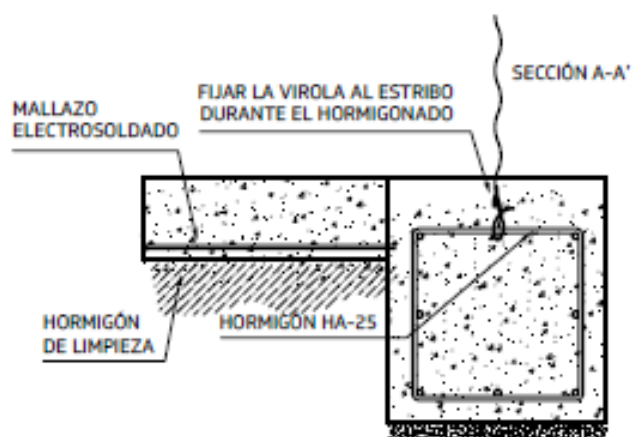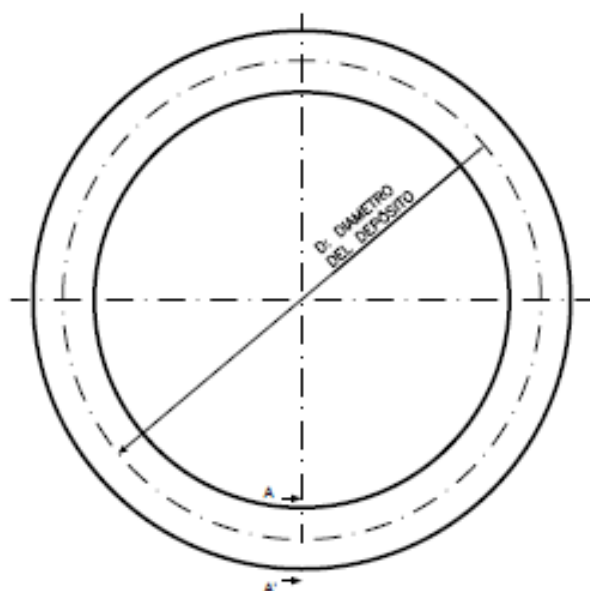

2.2 Cimentación


Previo al hormigonado se dispondrá una tubería para el vaciado (suministrada y montada por cuenta del cliente), cuyo material y dimensiones dependerá de las necesidades de uso, siendo por tanto elección del cliente, aconsejándose el

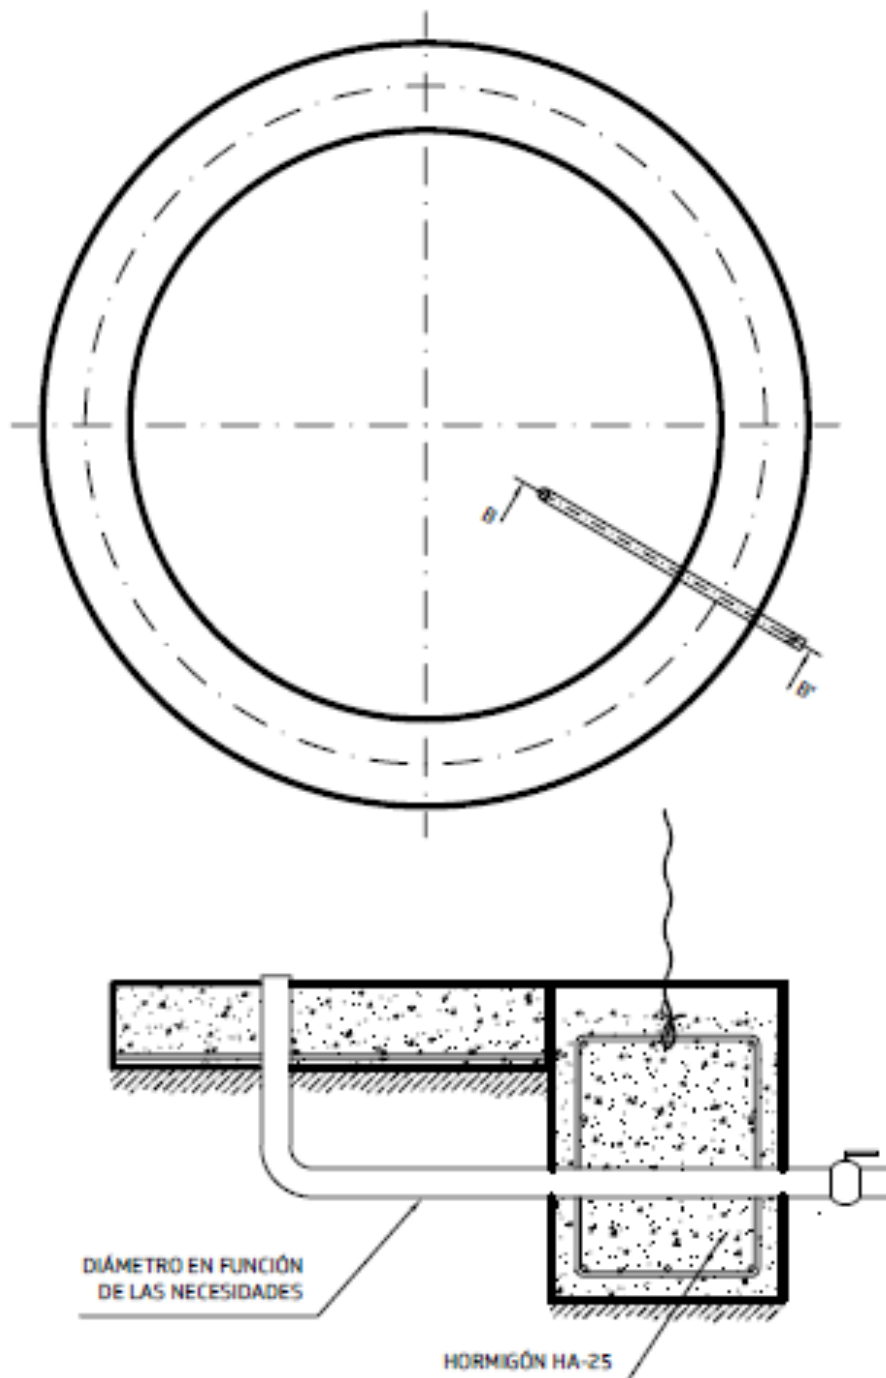


uso de PVC de tipo presión no menos de 2 pulgadas. La tubería ha de estar separada de la virola al menos 1,5mts.

2.3 Montaje de las chapas y posición de tornillos.

La primera virola ha de montarse sobre el zuncho antes del hormigonado, asegurándola a los estribos mediante un atado y posteriormente hormigonar el zuncho y la solera en una solo vez para evitar juntas y posibles pérdidas de agua. Hormigonada la primera virola y antes de que el hormigón fragüe es conveniente revisar el diámetro en la parte superior de la virola para comprobar que la circunferencia es correcta y se podrán montar fácilmente el resto de virolas.

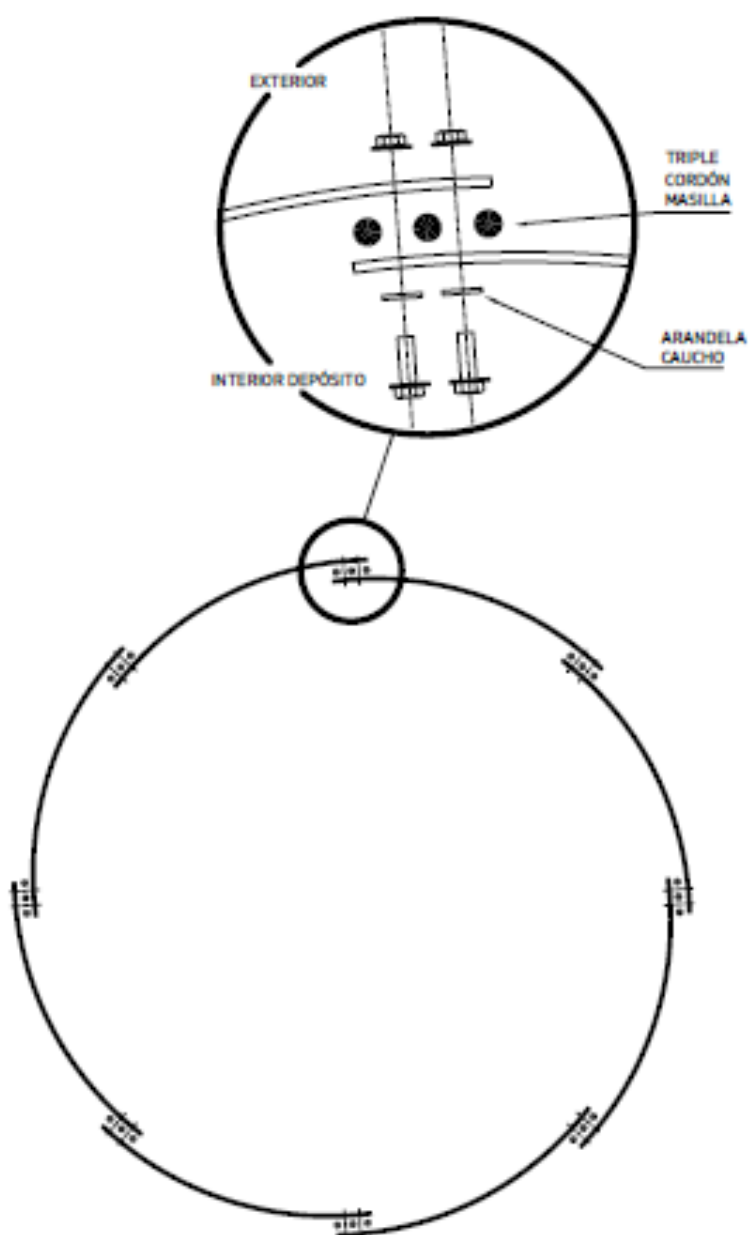

Cada virola o anillo del depósito se montará por el interior de la virola que se haya montado anteriormente (anillo inferior), y se hará coincidir la parte media de una chapa con la costura vertical de la virola interior, a modo de ladrillos en un muro. Los tornillos se colocarán por su interior, es decir, con la cabeza en el interior del depósito. También se colocará en el interior del depósito una arandela metálica curva y una arandela de caucho, yendo la arandela metálica plana y la tuerca por el exterior, tal como se indica en el plano. Hay que dar el par de apriete necesario para no romper la junta de goma y evitar la pérdida innecesaria de la masilla.

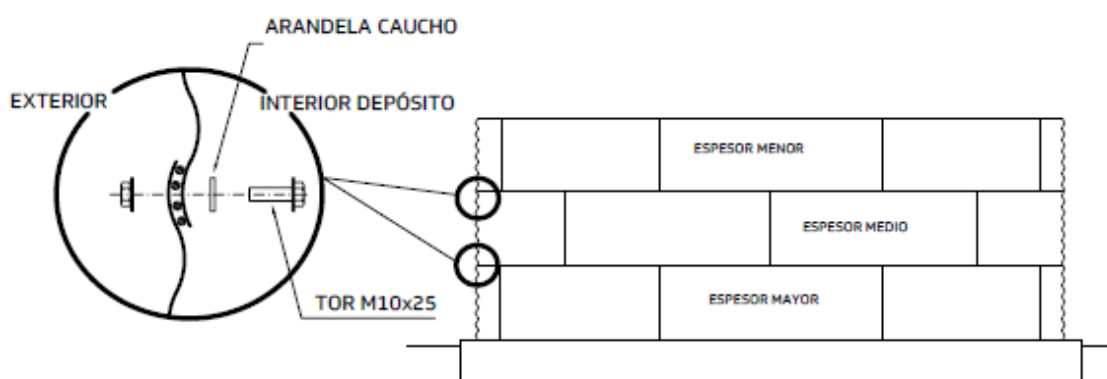


Nota: Cada chapa de la virola superior se monta por el interior de la virola anterior (inferior) y coincidiendo su punto medio con la costura vertical inferior, a modo de ladrillos en un muro.

2.4 Posición de la masilla.

Previo al montaje de cada chapa se aplicarán 3 cordones de masilla en la costura verticales y 2 cordones en las costura horizontales (uniones intermedias de los distintos anillos o virolas).

En aquellos puntos en que coincidan 3 chapas, se dispondrán 2 cordones adicionales de unos 10cm de longitud.

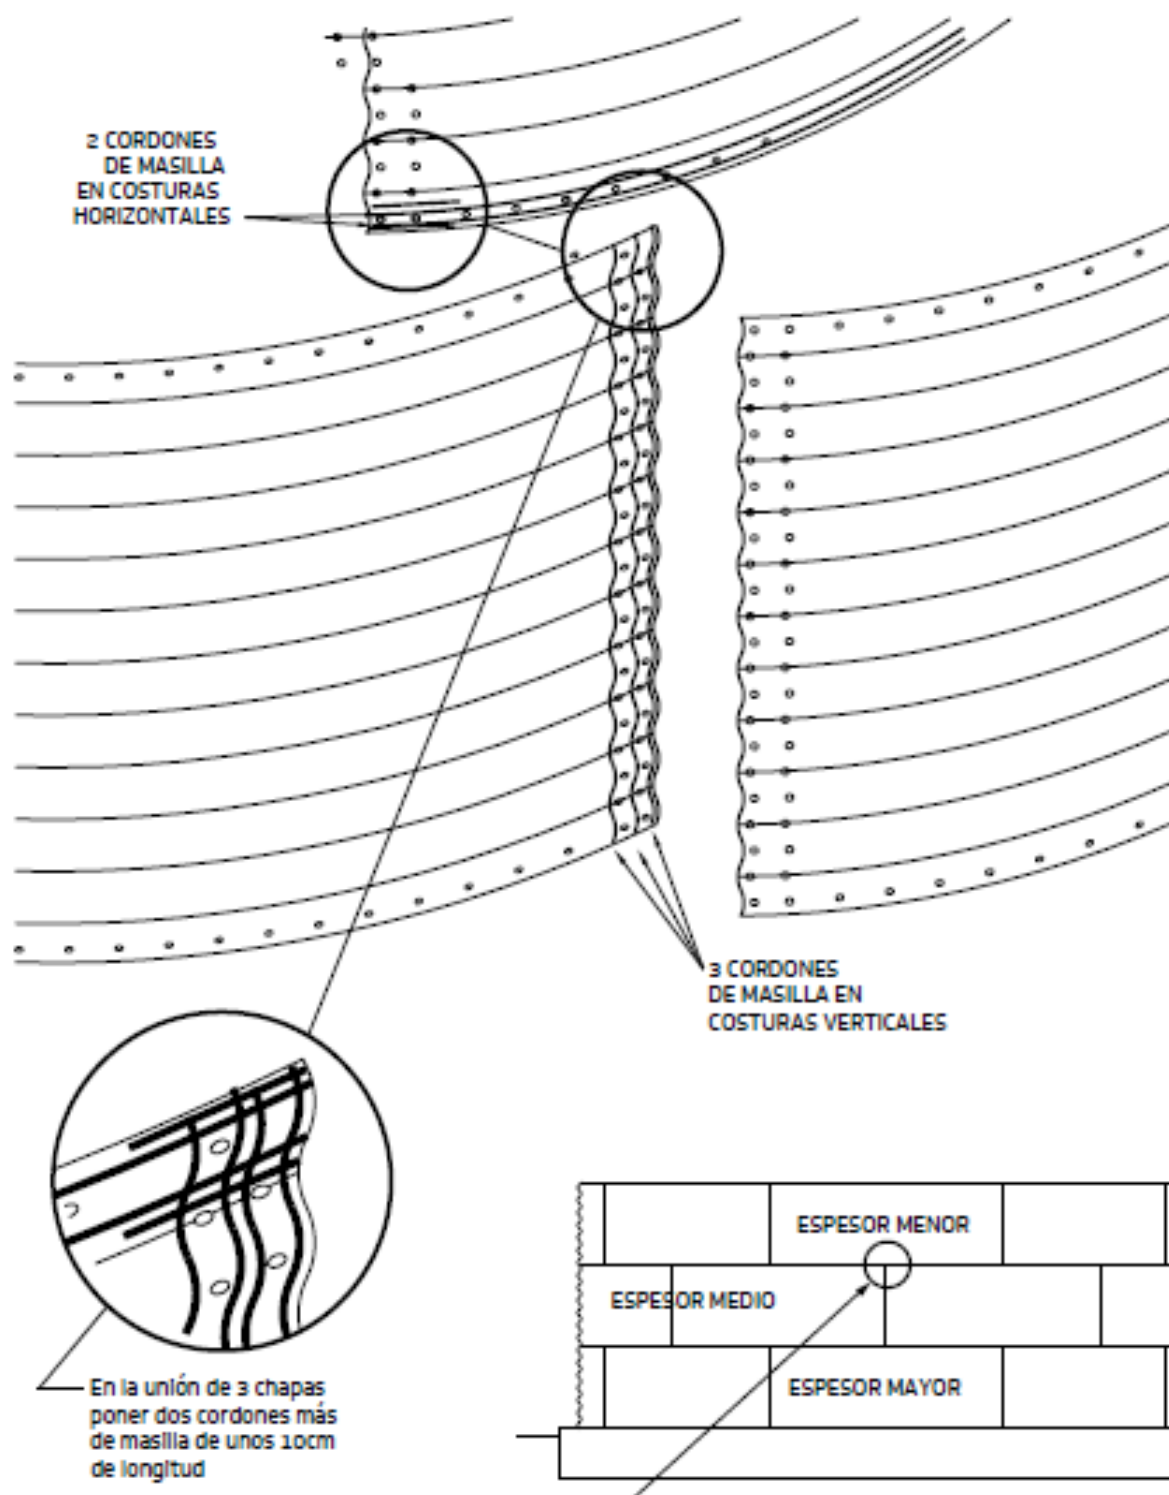

ANEXO PARA DEPOSITOS DE AGUA.**1. ESPECIFICACIONES GENERALES.**

Nota importante: cualquier característica especificada en este documento prevalece sobre el mismo. Esto quiere decir que valores diferentes no son una contradicción, sino una mejora o modificación respecto al estándar de fabricación.

1.1 ESPECIFICACIONES DE CHAPA.

Virolas galvanizadas:	Acero Galvanizado Z 600
Virolas prelacadas:	Acero Galvanizado Z 225
	Recubrimiento exterior verde 25 micras
	Recubrimiento interior blanco 7 micras

1.2 ESPECIFICACIONES DE TORNILLERIA.

Tornillos:	Acero Bicromatado M10 calidad 8.8
------------	-----------------------------------

1.3 ESPECIFICACIONES DE MASILLA.

Estanqueidad en uniones verticales entre chapas. Masilla selladora 100% sólido preformado de plasticidad permanente.

Base:	Caucho butílico
Color:	Blanco
Densidad:	1,20 – 1,6 g/cm ³ a 20° C
Rango temperatura:	-40°C a +80°C

1.4 ESPECIFICACIONES DE FUNDA (opcional).

Tejido de poliéster, ambos lados recubiertos de PVC libre de cadmio.

Tela:	DIN 60001	
Peso:	DIN EN ISO 2286-2	>600g/m
Resistencia a la tracción:	DIN EN ISO 1421	1900 N/cm
Resistencia al desgaste:	DIN 53 363	200 N
Uso:	Mantas impermeabilizantes	
Unión de paños:	Mediante fusión del PVC con calor	

2. CONDICIONES DE ALMACENAJE.

A pesar de que estas piezas disponen de tratamientos químicos de resistencia a los fenómenos meteorológicos como nieblas, lluvias o nieve debe de prestar especial atención a:

- 2.1. Para las operaciones de descarga disponga de operarios cualificados en la conducción de carretillas elevadoras y tenga en cuenta el lugar donde deposita los materiales.
- 2.2 Sea ordenado en la descarga de materiales para poder controlarlos a la hora de iniciar el montaje.
- 2.3 El almacenaje de todos los materiales galvanizados o prelacados debe de ser un lugar ventilado, aislado del suelo y cubierto. La infiltración de agua en el interior como consecuencia de lluvia o humedad puede provocar la formación de moho blanco, que produciría un efecto antiestético.

3. NORMAS DE USO.

El depósito de agua está diseñado y fabricado para el **almacenaje de agua exclusivamente**, por lo que un uso distinto podría dañarlo seriamente.

Si el agua con el que Ud. llenará el depósito se prevé que por su composición pueda ser agresiva al galvanizado de las chapas, se recomienda su protección mediante **el pintado de su superficie interior**, mediante una pintura en base al cloro-caucho o similar. En este respecto se aconseja seguir las indicaciones del fabricante de la pintura.

Así mismo se aconseja un **mantenimiento** mínimo, consistente en su vaciado periódico para su limpieza. En el caso de utilizar algún producto se aconseja consulte a su proveedor que sea adecuado y no dañe por tanto el galvanizado.

4. GARANTÍA Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES.

No se aceptarán reclamaciones referentes a cantidades de materiales transcurridos más de 15 días de la recepción del material.

4.1 Fabricación y materiales:

Gandaria garantiza los productos que fabrica y suministra libres de defectos en materiales y mano de obra bajo condiciones normales de uso y servicio durante un período de dos años a partir de la fecha de entrega al Cliente.

4.2 Condiciones, Limitaciones y Exclusiones:

La Garantía de los depósitos se extiende a dos años en:

- Defectos de fabricación de la chapa.
- Defectos de la tornillería, arandelas, fundas, y masilla.
- Defectos de transporte y montaje siempre que este se hubiera contratado con Gandaria.

Queda excluido de esta garantía:

- La aparición de óxido en las chapas.
- Los defectos de transporte y montaje por parte del cliente.
- Defectos ocasionados por fallos en la cimentación del depósito.
- Daños causados por la reacción del agua almacenada.**

Bajo los términos de la presente garantía, Gandaria no será responsable por daños personales o por daños materiales. La presente garantía no cubre defectos o daños causados por mal uso, mantenimiento inadecuado o instalación incorrecta del producto de Gandaria o de cualquier equipo vinculado a nuestros productos. La modificación en obra de este producto sin el permiso expreso por escrito por parte de Gandaria constituye un mal uso del producto. Gandaria no tendrá responsabilidad alguna bajo los términos de la presente garantía hasta que se haya efectuado el pago total del producto en cuestión por parte del cliente.

Esta es la única garantía ofrecida por Gandaria. Nadie está autorizado a ofrecer otras garantías en nombre de Gandaria.

5. TRABAJOS PREVIOS AL MONTAJE A REALIZAR POR EL CLIENTE.

5.1 DEPOSITOS CON FUNDA DE FONDO O COMPLETA

- Movimiento de tierra: Realizar desbroce y nivelación del terreno. Apertura del la zanja.
- Hormigón de limpieza(no suministrado): Echar hormigón de limpieza (H-200)en el fondo de la zanja con un espesor de unos 10 cm aproximadamente
- Colocación de la armadura(no suministrada)
- Colocación de la tubería (no suministrada): previo al hormigonado se colocará latubería a través de la armadura y separada 1.5 m de la pared del depósito.
- Hormigonado (no suministrado) del zuncho, dejando la superficie horizontal y nivelada.
- Excavación en toda la superficie del interior de 20 cm de profundidad.
- Rellenar con arena compactada por medios mecánicos la superficie.


5.2 DEPOSITOS SIN FUNDA

- Movimiento de tierra: Realizar desbroce y nivelación del terreno. Apertura del la zanja.
- Hormigón de limpieza(no suministrado): Echar hormigón de limpieza (H-200)en el fondo de la zanja con un espesor de unos 10 cm aproximadamente
- Colocación de la armadura del zuncho y mallazo del suelo.(no suministrada)
- Colocación de la tubería (no suministrada): previo al hormigonado se colocará latubería a través de la armadura y separada 1.5 m de la pared del depósito.
- Colocación de la primera virola por la empresa contratada para el montaje, amarrando esta a los estribos del zuncho mediante alambre.
- Hormigonado (no suministrado) del zuncho y suelo, dejando la superficie horizontal y nivelada, manteniendo la verticalidad de las chapas.

5.2 DEPOSITOS SIN FUNDA CON LONA OPACA

- Movimiento de tierra: Realizar desbroce y nivelación del terreno. Apertura del la zanja.
- Hormigón de limpieza(no suministrado): Echar hormigón de limpieza (H-200)en el fondo de la zanja con un espesor de unos 10 cm aproximadamente
- Colocación de la armadura del zuncho y mallazo del suelo.(no suministrada)

- Colocación de la tubería (no suministrada): previo al hormigonado se colocará la tubería a través de la armadura y separada 1.5 m de la pared del depósito.
- Colocación de la primera virola por la empresa contratada para el montaje, amarrando esta a los estribos del zuncho mediante alambre.
- Colocar poste central para apoyo de la lona opaca un metro por encima de la última chapa del depósito.
- Hormigonado (no suministrado) del zuncho y suelo, dejando la superficie horizontal y nivelada, manteniendo la verticalidad de las chapas.

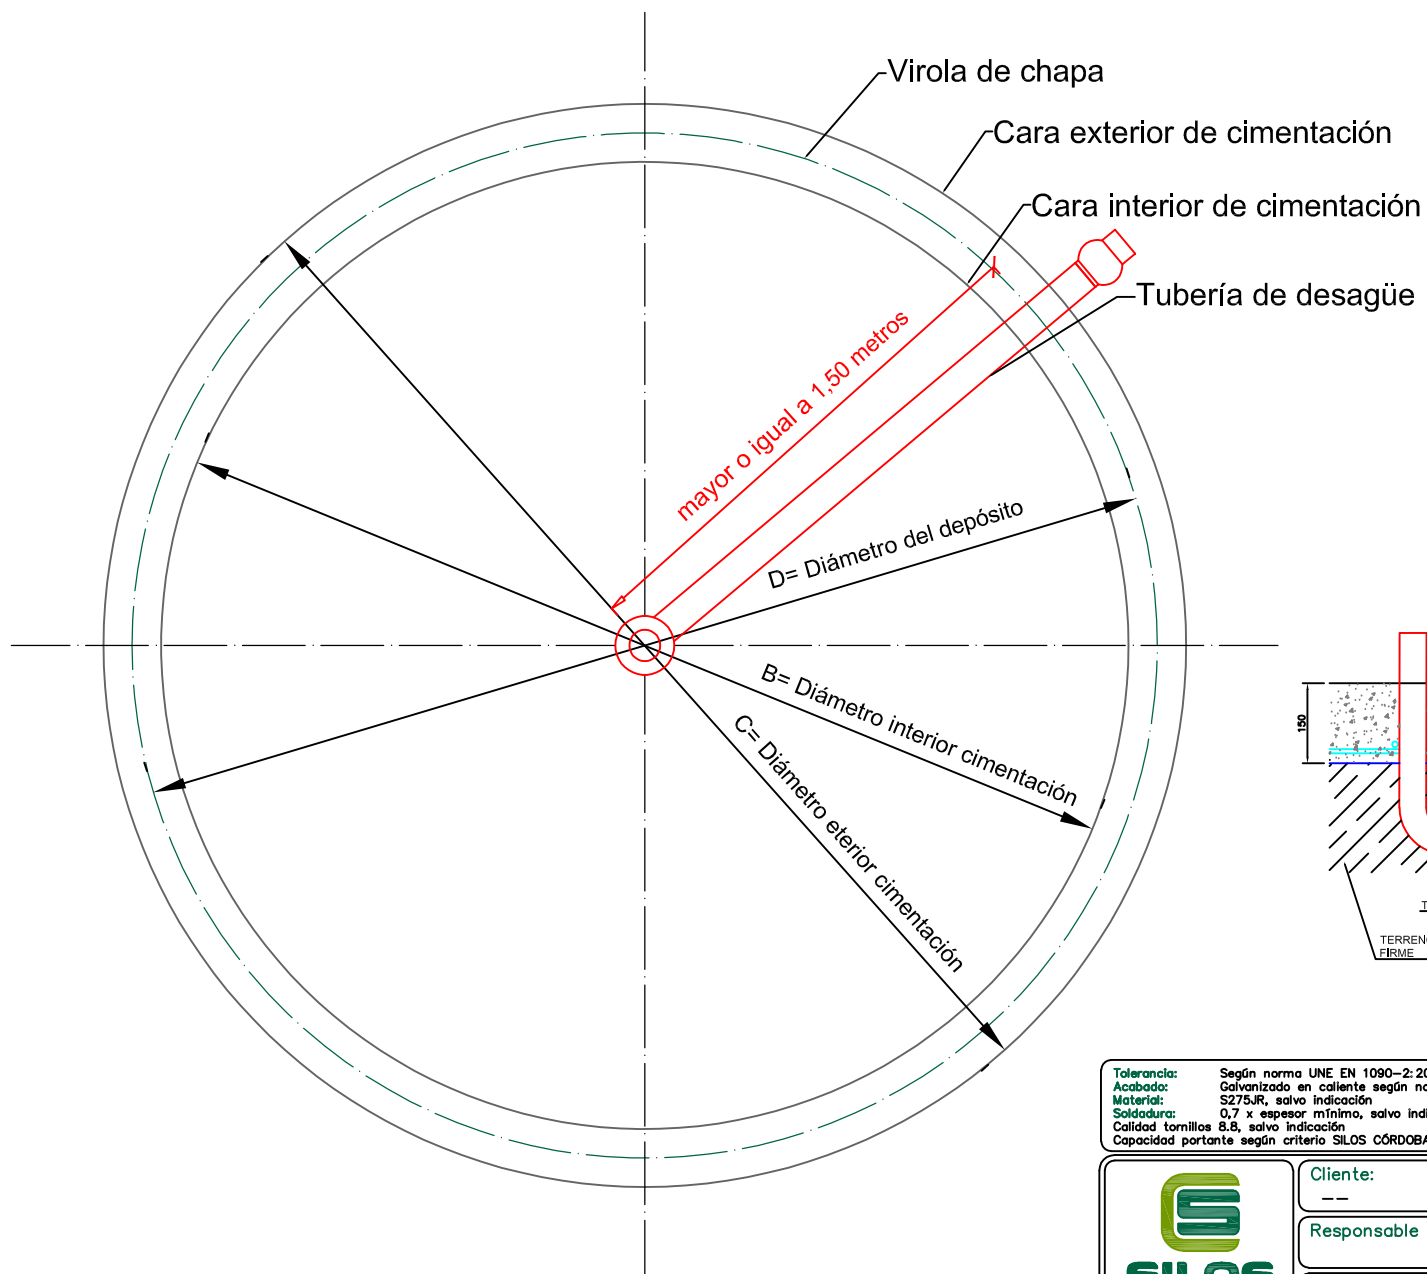

D= Diámetro del depósito

B= D - 20 cm.

C= D+ 20 cm.


EJEMPLO:

D= 11.46 metros.

B= 11.46 - 0.20 = 11.26 metros

C= 11.46 + 0.20 = 11.66 metros

ESTADO FINAL DEL MONTAJE

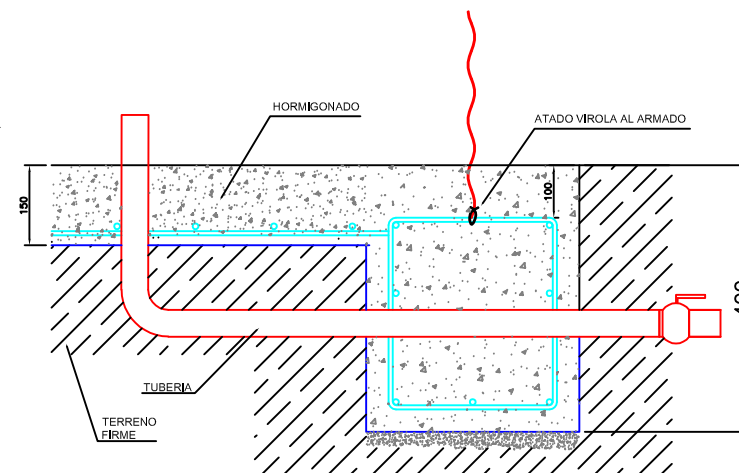

CIMENTACIÓN DEPÓSITOS MENORES 12 m.

Tolerancia: Según norma UNE EN 1090-2:2011 apartado nº 11
Acabado: Galvanizado en caliente según norma UNE EN ISO 1461
Material: S275JR, salvo indicación
Soldadura: 0,7 x espesor mínimo, salvo indicación
Calidad tornillos 8.8, salvo indicación
Capacidad portante según criterio SILOS CORDOBA, S.L.

Nº rev.	Rev.	Descripción de revisión	Fecha
---	---	---	---

C/ Astrónomo Anzures, 21 Paseo Científico Tecnológico Rabanera 21 14014 Córdoba. T +34 957 325 165 F +34 957 325 473 siloscordoba@siloscordoba.com www.siloscordoba.com	Cliente: ---	Ref.: ---	País: ---
	Responsable comercial: ---	Nº de oferta: ---	Nº de pedido: ---
	Descripción: ---	Dibujado: ---	Fecha: 05/2017
		Responsable técnico: ---	Formato: ---


Tipo de plano: ☒ Estudio previo ☐ Proyecto ☐ Aprobación	☐ Proyecto ☐ Fabricación	Escala:	Plano:
--	---	---------	--------

SIN FUNDA MENORES DE 12 M DE DIAMETRO CIMENTACIÓN

D=DIAMETRO DEL DEPOSITO

B=D-40cm

C=D+40cm

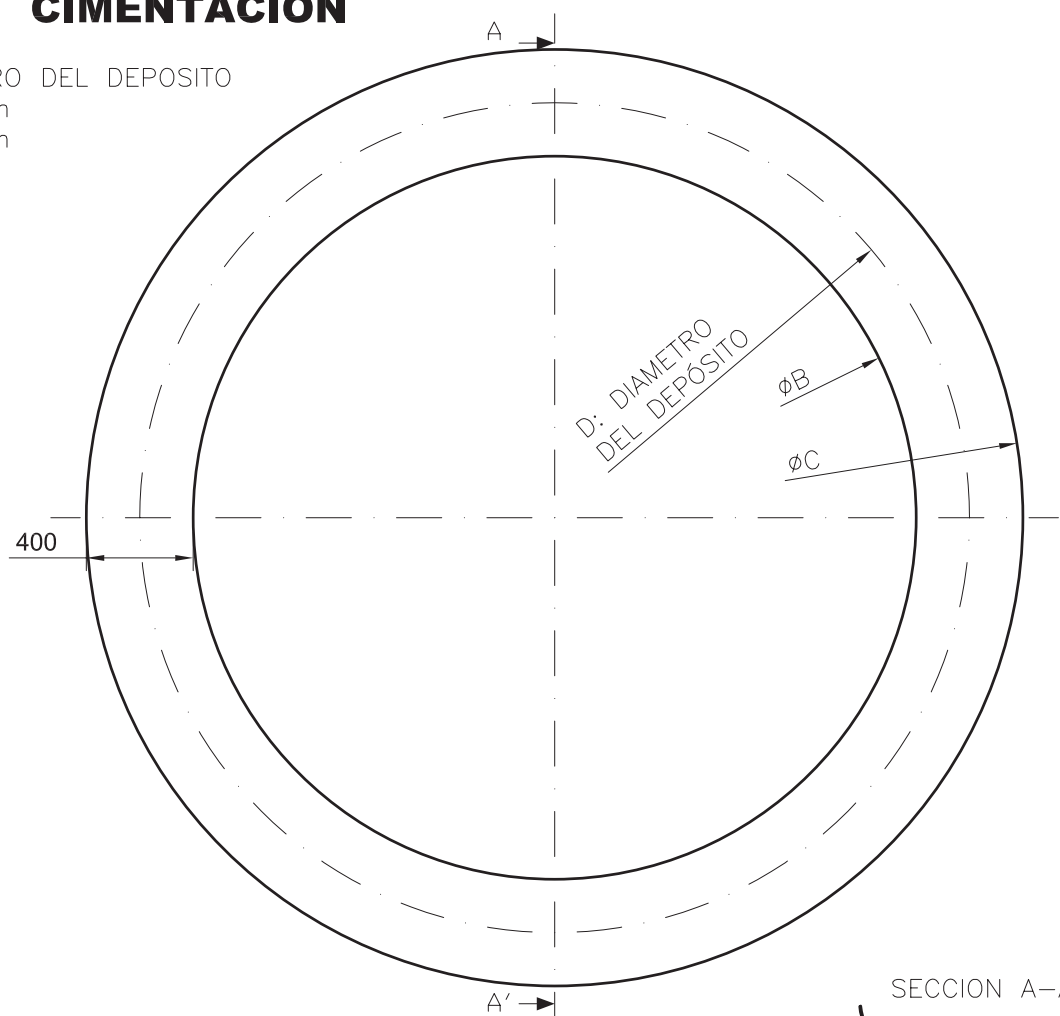

SECCION A-A'

MALLAZO $\phi 8$ 150x150mm.
ELECTROSOLDADO


FIJAR LA VIOLA AL ESTRIBO
DURANTE EL HORMIGONADO

HORMIGON DE LIMPIEZA

HORMIGON 14A-25

8 $\phi 12$
AEH-400

ESTRIBOS $\phi 8$
CADA 200mm.

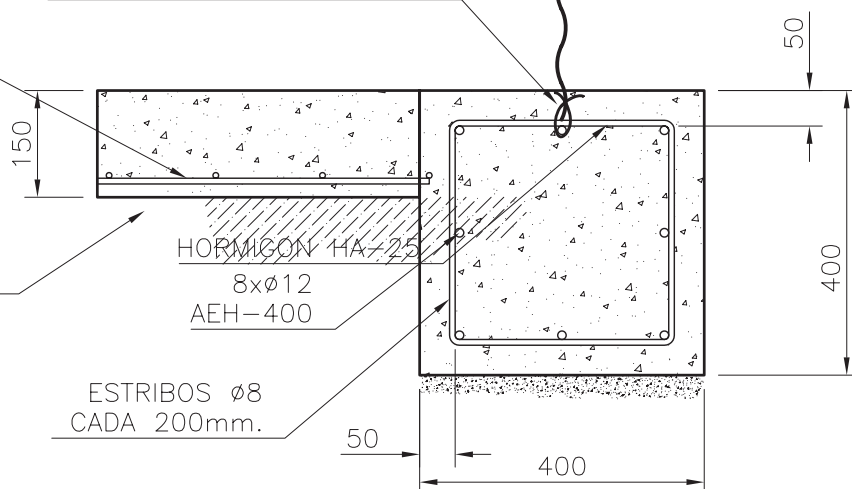

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Prédéclons sur les EPI listés dans l'évaluation de risque - Pour le personnel	
Ensemble des Travailleurs Edouard (Tous généraux)	Chaussures de sécurité, Casque de protection, Vêtements haute visibilité, Lunettes de protection, Gants de protection
Chauffeurs et Prestataires de Service (Accès et circulation sur le chantier) :	Chaussures de sécurité, Casque de protection, Vêtements haute visibilité, Lunettes de protection, Gants de protection
Stationnaires et Visiteurs (Présence sur le chantier) :	Chaussures de sécurité, Casque de protection, Vêtements haute visibilité, Lunettes de protection (Recommandées, surtout en zone d'activité)
Soudeur et chaudronnier	Casque de soudeur / Casque de soudeur; Casque de sécurité, Ecran facial; Lunettes de sécurité, Casque antibrûl; Masque de protection des voies respiratoires; Gants de soudage; Manchettes; Tablier (en cuir); Gilet (en cuir ou tissu ignifugé); Chaussures de sécurité.
Prédéclons sur les EPI listés dans l'évaluation de risque - Pour les échafauds	
Opérations de Travail en Hauteur	Chaussures de sécurité (avec bonne adhérence); Casque de protection (avec jugulaire); Normale de sécurité (antichute); Système d'arrêt de chute (longe, absorbeur d'énergie, articulé à rappel automatique); Pointe d'ancrage conforme; Gants de protection (adaptés à la tâche); Lunettes de protection (si risque de projection); Vêtements haute visibilité.
Électiciens (Exécutant Hors Tension)	Chaussures de sécurité (antichute); Casque de protection (antibrûl); Vêtements de travail adaptés (non conducteurs); Lunettes de protection (adaptées aux risques); Gants isolants (pour précaution); Tapis isolant (si nécessaire); Outils isolés.
Électiciens (Exécutant Sous Tension - Basse et Moyenne Tension)	Chaussures de sécurité (antichute); Casque de protection (isolant avec écran facial anti-arc); Vêtements de protection contre les arcs électriques (combinaison ou ensemble); Gants isolants (bonne appropria à la tension); Surcote en cuir; Manchettes isolantes (si nécessaire); Tapis isolant; Outils isolés (certifiés pour le travail sous tension); Détecteur de tension.
Contact avec Produits Chimiques	Chaussures de sécurité (résistantes aux produits chimiques); Vêtements de protection chimique (combinaison, tablier, etc., selon le produit); Gants de protection chimique (adaptés au produit manipulé); Lunettes ou écran facial de protection chimique; Protection respiratoire (masque avec filtre approprié) si nécessaire.
Opérations de Coupage et Moulage à l'Aide d'une Meuleuse Portable	Chaussures de sécurité; Lunettes de sécurité intégrales ; Ecran facial ; Gants de sécurité résistants ; Protection auditive; Vêtements de travail résistants; Tablier en cuir; Masque anti-projection.
Pénétration en Espace Confiné	Chaussures de sécurité; Casque de protection (avec jugulaire); Système de détention d'atmosphère (mélange); Appareil respiratoire autonome (si atmosphère dangereuse ou potentiellement dangereuse); Vêtements de travail adaptés; Gants de protection (selon les risques présents); Lunettes de protection (selon les risques présents); Lampe frontale antidéflagrante (si atmosphère potentiellement explosive).

Revisiteur	Date de l'audit	Date de prochain révision	Modèles liés à l'évaluation effectuée
Revis : Kaitia Aouine	07 Avril 2025	07 mai 25	1) En cas d'incident ou accident, 2) En cas d'urgence de secours ou d'incendie, 3) En cas de évènements réglementaires, 4) En cas d'un retour d'expérience le justifie.

ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Superviseur du montage du réservoir d'eau

Je soussigne, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité du **directeur** au sein de l'entreprise **de Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : HADIKI ABDERAZZAK

Né le : 25/08/1978

Titulaire de la carte d'identité n°BH255118

Poste : Superviseur du montage du réservoir d'eau

Est habilité par notre entreprise à superviser les opérations de montage et d'assemblage des éléments du réservoir, tout en assurant le contrôle de la qualité et le respect des normes de sécurité, ainsi que la finalisation et la vérification des installations.

Ce salarié justifie d'une **expérience professionnelle suffisante** dans le domaine du montage de réservoir d'eau et a suivi une **formation interne** relative aux procédures de montage spécifiques, à la lecture de plans techniques, et aux consignes de sécurité en vigueur.

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 Avril 2026, sauf révocation ou mise à jour des compétences.

Fait à Casablanca, le 01 avril 2025



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Superviseur du montage du réservoir d'eau

Je soussigne, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité du **directeur** au sein de l'entreprise **de Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : ADIL BARDOUD

Né le : 25/12/1989

Titulaire de la carte d'identité n° BB85581

Poste : Superviseur du montage du réservoir d'eau

Est habilité par notre entreprise à superviser les opérations de montage et d'assemblage des éléments du réservoir, tout en assurant le contrôle de la qualité et le respect des normes de sécurité, ainsi que la finalisation et la vérification des installations.

Ce salarié justifie d'une **expérience professionnelle suffisante** dans le domaine du montage de réservoir d'eau et a suivi une **formation interne** relative aux procédures de montage spécifiques, à la lecture de plans techniques, et aux consignes de sécurité en vigueur.

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 Avril 2026, sauf révocation ou mise à jour des compétences.

Fait à Casablanca, le 01 avril 2025

A circular blue ink stamp from EuroHinca Maroc, S.R.L. is located at the bottom right. The stamp contains the company name and a central logo. A handwritten signature in blue ink is written across the stamp.
